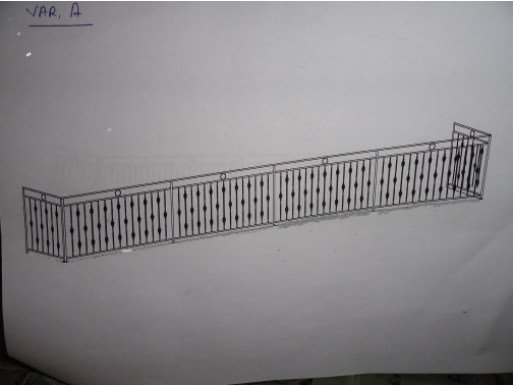



Proj_vakantiekamp Cornel

versie: 20110323

Plaats: Valea Draganului, Roemenië

Contactpersoon: Cornel Fedor

<p>Buitengevels De buitengevels staan nog in ruwbouw. Voor het verzekeren van de vergunning is nodig dat tenminste de voorgevel wordt afgewerkt. Hiervoor is een bedrag van ca. 4000 euro gemoeid. Het totale afwerken van de gevels is beraamd op 13.000 euro mits in één keer gebeurd. Gevels isoleren met 10 cm polystyreen, afdekken met glasvezelwapeningsgaas Afleisteren met sierpleister Bepleisteren schoorsteen</p> <p>Werk uitbesteed aan: Decor Dany Building SRL</p>	<p>Vragen Hoe staat het met de opstalverzekering en inboedelverzekering</p>
<p>Balkons Hekwerk op de 5 balkons = 48 m¹ materiaal 1945 euro huur lasapparaat ca. 20 dagen arbeid 500 euro Hiervoor reeds 2500 euro overgemaakt.</p>  <p>Betegeling 78 m² met antislip tegels</p>	<p>wie betaald de huur van de lasapparatuur.</p> <p>Zijn de tegels er al? aanbrengen door werkploeg?</p>
<p>Boeiboorden en overstekken Afwerken boeiboorden ca. 130m¹ en overstekken ca. 85cm met hout of hardplastic</p>	<p>wie doet de betimmering, is dit ook iets voor Sliedrecht?</p>
<p>Raamdorpels Raamdorpels onder de vensters met aluminium of kunststof totaal ca. 126 m¹, breed 175mm</p>	<p>hoe wordt dit gefinancierd?</p>
<p>Keuken De keuken moet worden afgewerkt. Hierin moet een wasruimte beschikbaar zijn voor het keukenpersoneel. Het afwerken van de keuken is beraamd op 4800 euro exclusief de apparatuur. Apparatuur voor de koeling is begroot voor 1200 euro.</p>	<p>wat kan de vakantiewerkploeg hiervoor betekenen? rest uitbesteden?</p>
<p>Badruimtes Badruimtes en sanitair worden verzorgd door de werkgroep uit Sliedrecht, contactpersoon dhr. Jaap Huisman.</p>	

<p>Slaapvertrekken De slaapvertrekken zijn gereed, er is nog wel behoefte aan bedden, beddegoed e.d.</p>	<p>wat is hier nog nodig aan bedden e.d.?</p>
<p>Bovenzolder De bovenzolder moet worden afgewerkt voor binnen activiteiten voor de jeugd. De werkgroep uit Sliedrecht neemt dit voor zijn rekening.</p>	
<p>Buitenriolering en afvoeren Buiten dienen te afvoeren worden aangesloten op septictanks die daarna kunnen lozen op het oppervlaktewater. Voor 100 personen is een bepaalde capaciteit nodig.</p> <p>voorbeeld HDPE tanks gekoppeld</p>  <p>om de 2 jaar dienen ze leeggemaakt te worden bij laag grondwaterpeil!</p>	<p>Is hiervoor al een begroting?</p>
<p>Overige werkzaamheden</p>	
